


CONSTRUÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE CORURIBE  
PROC. ADM. 36.915/2013

- PLANEJADO PARA 7ª MEDIÇÃO: R\$ 221.690,58
- 7ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 17.685,46
- DISCREPÂNCIA: 204.005,12
- ATINGIU: 7,98% DA META

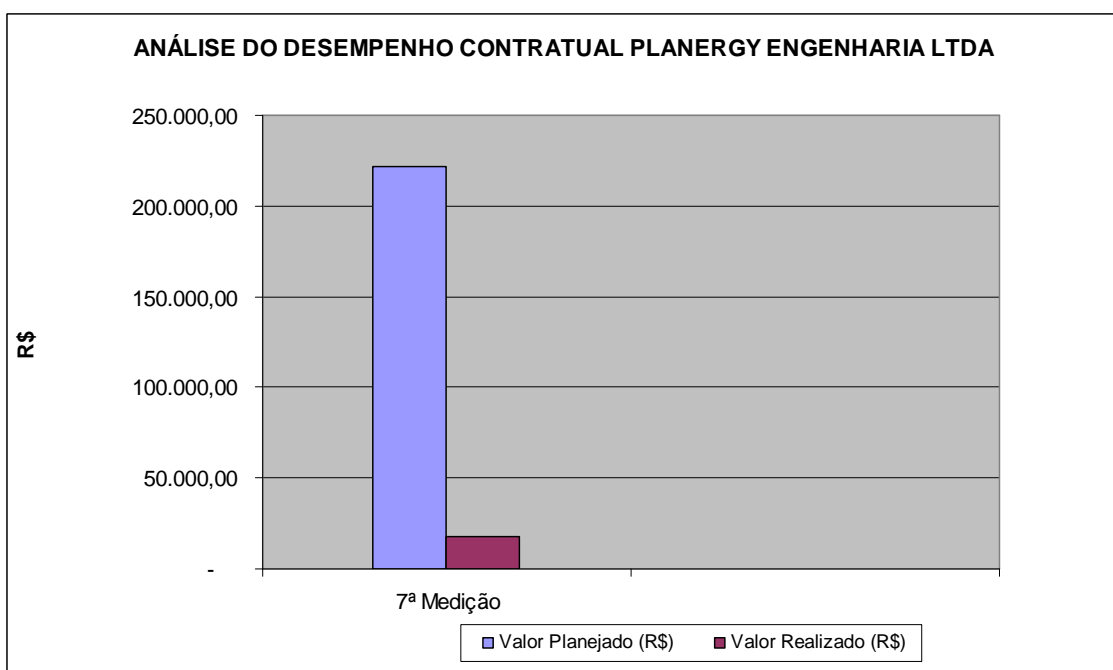

Thiago Pontes de Alencar  
Fiscal Substituto do Contrato
