


REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS VARAS DO TRABALHO DE ARAPIRACA
PROC. ADM. 31831/2013

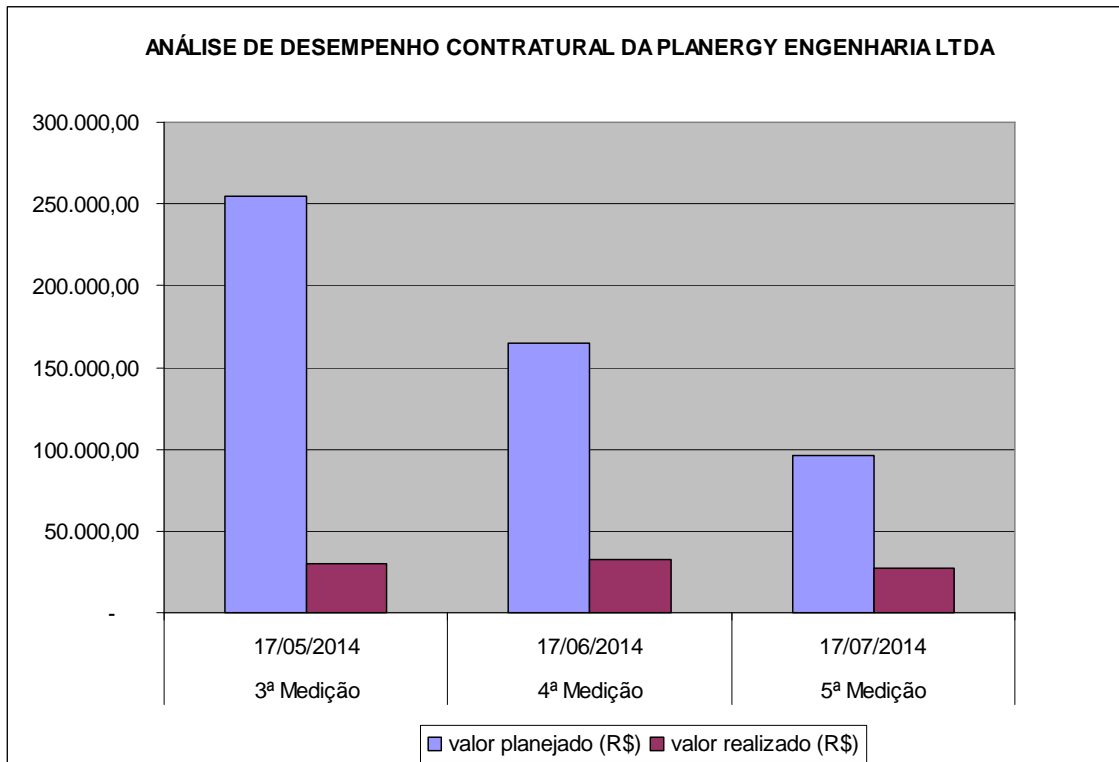

- PLANEJADO PARA 3ª MEDIÇÃO: R\$ 254.896,28
- 3ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 29.891,76
- DISCREPÂNCIA: 225.004,52
- ATINGIU 11,73% DA META

- PLANEJADO PARA 4ª MEDIÇÃO: R\$ 164.578,63
- 4ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 32.960,25
- DISCREPÂNCIA: 131618,38
- ATINGIU 20,03% DA META

- PLANEJADO PARA 5ª MEDIÇÃO: R\$ 96.083,67
- 4ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 27.350,16
- DISCREPÂNCIA: 131618,38
- ATINGIU 28,38% DA META
